



PPC

PPC-Pro

Manual Operacional de Uso

Guia detalhado para implantação, operação semanal e leitura gerencial do sistema.

O que este manual entrega

- Explica como entrar no sistema, escolher a obra e navegar pelos módulos;
- Mostra como configurar cadastros gerais e cadastros específicos da obra;
- Ensina, passo a passo, a operar Pré-programação, Reunião de PPC, Programação, Feedback e Qualidade Percebida;
- Detalha as regras de negócio que controlam pendências, reservas, causas, travas, fechamentos e reaberturas;
- Aponta onde gerar PDFs, relatórios e dashboards, além de orientar a leitura dos indicadores.



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. ACESSO E NAVEGAÇÃO	3
2.1 Tela de Login e entrada na obra	3
2.2 Tela inicial da obra	3
2.3 Menu lateral e lógica de navegação	4
3. CADASTROS GERAIS	5
3.1 Usuários e Perfis de Permissionamento	5
3.2 Cadastro de Obra	5
3.3 Empreiteiros, Tipos de Mão de Obra e Construtora	6
3.4 Causas de não cumprimento e grupos de atividades	6
4. CADASTROS DA OBRA	8
4.1 Zoneamento	8
4.2 Empreiteiros da obra e grupos da obra	8
4.3 Feriados, prazos e parâmetros de qualidade percebida	9
5. FLUXO SEMANAL OPERACIONAL	10
5.1 Pré-programação da Semana	10
5.2 Reunião de PPC	11
5.3 Programação da Semana	12
5.4 Atividades Previstas	13
5.5 Feedback da Semana	13
5.6 Qualidade Percebida	14
6. RELATÓRIOS, PDFS E DASHBOARDS	16
6.1 PDFs operacionais	16
6.2 Relatório da Semana	16
6.3 Histórico da obra	17
7. REGRAS DE NEGÓCIO FUNDAMENTAIS	18
7.1 Ordem das etapas e travas	18
7.2 Pendências, reservas, retrabalho e semana de origem	18
7.3 Causas, cancelamentos e desempenho	18
7.4 Fechamento, reabertura e auditoria	18
8. CHECKLIST DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO	19
8.1 Antes de começar a usar em uma obra nova	19
8.2 Rotina semanal recomendada	19
8.3 Erros mais comuns e como evitar	19



1. INTRODUÇÃO

O PPC-Pro foi estruturado para apoiar a engenharia da obra no controle do planejamento de curto prazo. Ele não funciona apenas como uma planilha digital de tarefas. O valor do sistema está em conduzir uma rotina completa: preparar a semana seguinte, validar com os empreiteiros, consolidar a programação, registrar o que de fato aconteceu em campo, avaliar a qualidade percebida e transformar tudo isso em informação gerencial confiável.

Para um usuário novo, a melhor forma de aprender é respeitar a sequência do processo. O sistema foi desenhado para que cada etapa alimente a seguinte e para que o histórico permaneça íntegro. Por isso, ao longo deste manual, além de descrever onde clicar, nós também explicamos a lógica operacional por trás de cada módulo.

Leitura recomendada

- Se esta é a primeira implantação da obra, comece pelos capítulos de acesso, navegação e cadastros.
- Se a base já está pronta e você quer apenas operar a semana, vá direto ao capítulo 5.
- Se a sua função é mais gerencial, leia com atenção os capítulos 6 e 7.




2. ACESSO E NAVEGAÇÃO

2.1 Tela de Login e entrada na obra

Como chegar lá: ao abrir o sistema, a primeira tela exibida é a de login. Preencha e-mail e senha e clique em "Acessar".

- Usuários administradores escolhem primeiro se querem entrar em uma obra ou trabalhar nos cadastros gerais.
- Usuários comuns entram diretamente no seletor de obras às quais possuem acesso.
- A obra escolhida passa a determinar quais dados o sistema irá carregar nas etapas seguintes.

Tela de entrada do sistema

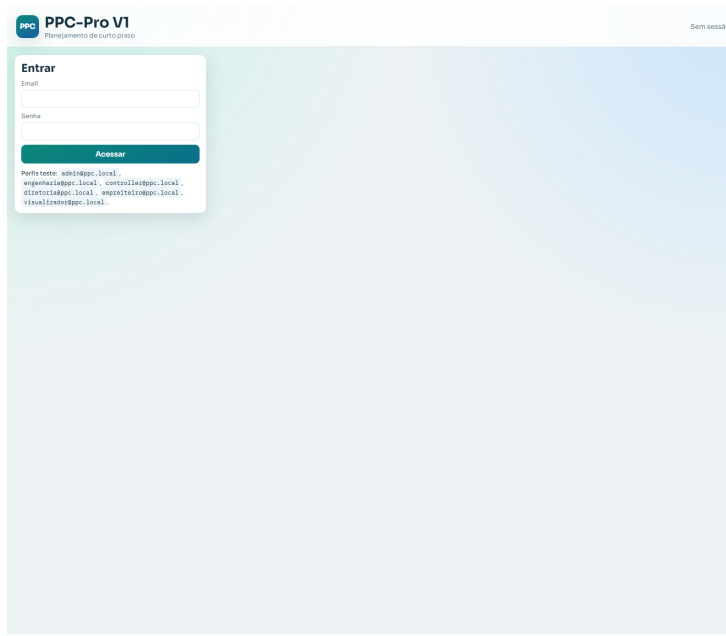

A autenticação é o ponto de partida do fluxo. A partir dela, o sistema sabe quem é o usuário, quais permissões ele possui e em quais obras ele pode atuar.

2.2 Tela inicial da obra

Como chegar lá: depois de escolher a obra, o sistema abre a Tela Inicial. Essa tela resume o status das semanas e oferece links rápidos para os módulos mais importantes.

- O quadro "Próximas Ações Recomendadas" ajuda a equipe a entender o próximo passo esperado.
- O painel resumido mostra as semanas recentes e futuras, sinalizando visualmente quais etapas estão pendentes e quais já foram fechadas.

- Os links rápidos servem para levar o usuário à rotina certa sem depender de memória sobre o menu completo.

Tela Inicial da obra

PPC-Pro V1
Planejamento de curto prazo

Administrador PPC (ADMIN)

BEM-VINDO À OBRA
EUROVILLE SMART HOUSING
91740830

Escolha abaixo o módulo que deseja acessar. O menu lateral continua disponível para navegação completa e detalhada.

Próximas Ações Recomendadas

Fechar Pré-programação da Semana 14
Essa costuma ser a primeira entrega da semana seguinte. Vale revisar pendências, reservas e empenheiros ativos.

[Abrir](#)

Preencher Feedback da Semana 12
Essa etapa fecha o que realmente aconteceu em campo e alimenta relatórios, pendências e histórico.

[Abrir](#)

Painel Resumido das Semanas

SEMANA	INÍCIO	FIM	PRÉ-PROGRAMAÇÃO	REUNIÃO SEMANAL	PROGRAMAÇÃO	FEEDBACK	QUALIDADE PERCEBIDA
Semana -2 Sem. 11	01/06/2026	06/06/2026	X	X	X	X	X
Semana -1 Sem. 12	08/06/2026	13/06/2026	X	X	X	X	X
Semana Atual Sem. 13	15/06/2026	21/06/2026	X	X	X	X	X
Semana +1 Sem. 14	22/06/2026	28/06/2026	X	X	X	X	X

■ No prazo
 ■ No dia do prazo
 ■ Prazo vencido
 V = Fechada
 X = Pendente

Programação Semanal

[Pré-Programação da Semana](#)

[Reunião de PPC](#)

[Programação da Semana](#)

[Atividades Previstas](#)

Feedback

[Feedback da Semana](#)

[Qualidade Percebida](#)

Esta é a melhor porta de entrada para o uso diário. Ela evita que o usuário "caia" em uma etapa aleatória sem contexto sobre o restante da semana.

2.3 Menu lateral e lógica de navegação

O menu lateral é o mapa do sistema. Ele separa o que é cadastro geral, o que é fluxo semanal, o que é feedback, o que é análise gerencial e o que é específico da obra. Para um usuário novo, isso reduz ansiedade porque deixa claro em que bloco cada ação acontece.

Boa prática de navegação

- Use a Tela Inicial para entender a prioridade da semana.
- Use o menu lateral para entrar no módulo exato que deseja operar.
- Evite alternar entre módulos sem salvar o que foi preenchido.



3. CADASTROS GERAIS

Os cadastros gerais são a base mestre do sistema. Em regra, tudo o que é cadastrado aqui pode ser reaproveitado em várias obras. Isso evita retrabalho, padroniza nomenclaturas e reduz inconsistências.

3.1 Usuários e Perfis de Permissionamento

Como chegar lá: Menu Lateral > Cadastros Gerais > Cadastro de Usuário > Usuários ou Perfis de Permissionamento.

- Em "Usuários", registre nome, empresa, e-mail, senha, papel base e obras vinculadas.
- Em "Perfis de Permissionamento", concentre as permissões por função, evitando configurar usuário por usuário manualmente.
- O vínculo de obras determina em quais empreendimentos a pessoa poderá entrar.
- O perfil define o que ela poderá ver, editar, fechar ou reabrir.

3.2 Cadastro de Obra

Como chegar lá: Menu Lateral > Cadastros Gerais > Cadastro de Obra.

- Cadastre nome da obra, CEP, endereço, data de início e meta PPC.
- A data de início define a contagem das semanas da obra. A semana 1 sempre contém a data inicial, mesmo que a obra comece no meio da semana civil.
- A meta PPC é usada em alertas, boxes de desempenho, relatórios semanais e históricos.

Cadastro de Obra

PPC-Pro V1
Planejamento de curto prazo

Administrador PPC (ADMIN)

BEM-VINDO À OBRA
DELPRO
EUROVILLE SMART HOUSING
91740830

Escolha abaixo o módulo que deseja acessar. O menu lateral continua disponível para navegação completa e detalhada.

Próximas Ações Recomendadas

Fechar Pré-programação da Semana 14
Essa costuma ser a primeira entrega da semana seguinte. Vale revisar pendências, reservas e empreiteiros ativos.
[Abrir](#)

Preencher Feedback da Semana 12
Essa etapa fecha o que realmente aconteceu em campo e alimenta relatórios, pendências e histórico.
[Abrir](#)

Painel Resumido das Semanas

SEMANA	INÍCIO	FIM	PRÉ-PROGRAMAÇÃO	REUNIÃO SEMANAL	PROGRAMAÇÃO	FEEDBACK	QUALIDADE PERCEBIDA
Semana -2 Sem. 11	01/06/2026	06/06/2026	X	X	X	X	X
Semana -1 Sem. 12	08/06/2026	13/06/2026	X	X	X	X	X
Semana Atual Sem. 13	15/06/2026	21/06/2026	X	X	X	X	X
Semana +1 Sem. 14	22/06/2026	28/06/2026	X	X	X	X	X

☐ No prazo
 ☐ No dia do prazo
 ☐ Prazo vencido
 V = Fechada
 X = Pendente

Programação Semanal

Pré-Programação da Semana

Reunião de PPC

Programação da Semana

Atividades Previstas

Feedback

Feedback da Semana

Qualidade Percebida

O modal de obra foi desenhado para deixar claro o que cada campo representa. A validação de CEP reduz erro manual de endereço e ajuda o sistema a trabalhar melhor com clima e identificação da obra.

3.3 Empreiteiros, Tipos de Mão de Obra e Construtora

- Empreiteiros são cadastrados na base geral com empresa, encarregado, e-mail, telefone e tipo de mão de obra.
- Tipos de mão de obra servem para filtrar e padronizar análise por especialidade.
- O cadastro da construtora alimenta cabeçalhos de PDFs, relatórios e documentos oficiais.

Regra importante

- Editar um empreiteiro dentro de uma obra não pode alterar o cadastro geral.
- Na obra, o sistema trabalha com uma cópia operacional do empreiteiro importado.

3.4 Causas de não cumprimento e grupos de atividades

- Cadastre causas em dois níveis: totalizadora (nível 1) e causa específica (nível 2).
- Ao marcar uma causa como "específica do empreiteiro", ela passa a afetar indicadores de desempenho que procuram separar responsabilidade direta da empresa executora.



- Grupos de atividades funcionam como templates reutilizáveis para montagem rápida da semana.



4. CADASTROS DA OBRA

Cadastros da obra são específicos de cada empreendimento. Eles organizam a realidade física, operacional e de governança daquela obra.

4.1 Zoneamento

Como chegar lá: Menu Lateral > Cadastros da Obra > Zoneamento.

- Local 1 representa a camada principal do zoneamento.
- Local 2 detalha subdivisões dentro do Local 1.
- Sempre que possível, mantenha o zoneamento alinhado à forma como a engenharia e os empreiteiros falam da obra no dia a dia.
- Esse cadastro é usado em programação, feedback, mapa de calor, distribuição por zona e PDFs.

Cadastro de Zoneamento

PPC-Pro V1
Planejamento de curto prazo
Administrador PPC (ADMIN)

Cadastros da obra

Zoneamento | Empreiteiros | Grupos de atividades da obra | Fertidos | Prazos | Qualidade Percebida

Zoneamento

Cadastro de Nivel 1

Novo Item Nivel 1 (ex.: Pavimento 12) **Cadastrar Nivel 1**

Nivel 2 via edição do Nivel 1

Use o ícone de lápis do Nivel 1 para renomear e incluir itens de Nivel 2 em lote.

Selecione o Nivel 1 **Novo Item Nivel 2 (ex.: Apartamento 1204)** **Cadastrar Nivel 2**

ZONAS CADASTRADAS		
NÍVEL	DESCRIÇÃO	AÇÕES
N1	01	[edit] [delete]
N2	Frente	[delete]
N2	Fundos	[delete]
N2	Interno	[delete]
N1	02	[edit] [delete]
N2	Frente	[delete]
N2	Fundos	[delete]
N2	Interno	[delete]
N1	03	[edit] [delete]
N2	Frente	[delete]
N2	Fundos	[delete]
N2	Interno	[delete]
N1	04	[edit] [delete]
N2	Frente	[delete]
N2	Fundos	[delete]
N2	Interno	[delete]
N1	05	[edit] [delete]
N2	Frente	[delete]
N2	Fundos	[delete]

O Local 1 organiza a estrutura principal da obra. O Local 2 entra como detalhamento. Essa hierarquia é fundamental para relatórios, distribuição de atividades e leitura de produtividade por zona.

4.2 Empreiteiros da obra e grupos da obra



- Importe para a obra somente os empreiteiros que realmente atuarão nela.
- Aplique o mesmo princípio aos grupos de atividades: importe o que faz sentido e complementa com grupos específicos da obra quando necessário.
- No nível da obra, você pode ajustar nome do grupo e tarefas sem alterar a base geral.

4.3 Feriados, prazos e parâmetros de qualidade percebida

- Feriados aparecem destacados em planejamento, feedback e documentos, ajudando a equipe a lembrar restrições do calendário.
- Prazos definem até quando cada etapa deve ser fechada e alimentam contadores regressivos e indicadores de governança.
- O cadastro de Qualidade Percebida define faixas e referências para PPC, colaboração, qualidade, segurança e limpeza.



5. FLUXO SEMANAL OPERACIONAL

Este é o coração do PPC-Pro. O sistema foi desenhado para que a semana atravessasse etapas com propósito claro. Quando o fluxo é respeitado, o histórico fica consistente e os relatórios ganham valor. Quando a equipe pula etapas, começa a perder contexto e confiabilidade.

5.1 Pré-programação da Semana

Como chegar lá: Menu Lateral > Programação Semanal > Pré-programação da Semana.

- A Pré-programação é a primeira versão da semana futura. Ela organiza o que se pretende discutir com os empreiteiros antes da validação final.
- Nessa etapa, o sistema já pode carregar pendências e reservas herdadas automaticamente de semanas anteriores.
- Atividades planejadas que não foram concluídas reaparecem como Pendentes. Atividades Reserva não concluídas reaparecem como Reserva.
- Pendentes devem preservar texto e locais travados. Reservas podem continuar como Reserva ou virar Planejada na nova semana.
- O Local 1 é obrigatório para fechar a etapa.

Pré-programação da Semana

PPC-Pro V1
Planejamento de curto prazo

Administrador PPC (ADMIN)

Abertura e controle da pré-programação

Pré-programação da semana

Monte a primeira versão da semana seguinte, trazendo pendências e reservas anteriores para a conversa com os empreiteiros. Aqui faz sentido organizar o pacote e sinalizar o que ainda precisa ser validado na reunião de PPC.

14 22/06/2026 27/06/2026 **Atualizar**

Prazo da pré-programação: Sexta-feira, 19/06/2026 às 12:00 (hora local da obra) | Tempo restante: 3d 12h 22m 38s

Status da pré-programação: Aberta.

TOTAL DE LINHAS 0 Inclui linhas novas ainda não salvas.	PENDÊNCIAS 0 Viram de semanas anteriores e ficam travadas nos campos off/lock.	RESERVAS 0 Podem continuar como reserva ou virar planejada na nova semana.	RETRABALHOS 0 Mostra quantas atividades já entraram com status de retrabalho.
--	---	---	--

Fechar pré-programação

Previsão do tempo (domingo a sábado)

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026
Nublado	Chuva	Sol	Nublado	Nublado	Nublado	Sol
Min 7.9°C / Máx 19.0°C Prob. chuva: 40%	Min 10.2°C / Máx 14.6°C Prob. chuva: 54%	Min 7.9°C / Máx 14.5°C Prob. chuva: 21%	Min 5.9°C / Máx 12.1°C Prob. chuva: 23%	Min 8.2°C / Máx 15.2°C Prob. chuva: 24%	Min 5.3°C / Máx 11.9°C Prob. chuva: 22%	Min 4.4°C / Máx 14.8°C Prob. chuva: 18%
Chuva: 1.0 mm/h	Chuva: 21.2 mm/h	Chuva: 0.0 mm/h	Chuva: 3.6 mm/h	Chuva: 4.8 mm/h	Chuva: 0.0 mm/h	Chuva: 0.0 mm/h

Leitura rápida da planilha

Como ler a planilha desta etapa

- **Pendente:** veio de semana anterior, mantém tarefa e locais travados para preservar o histórico.
- **Reserva:** volta para a semana seguinte como reserva, mas o status pode ser ajustado para *Planejada* quando fizer sentido.
- **Rascunho:** linha azul criada localmente e ainda não salva.
- **Semana de origem:** ajuda a entender de onde cada atividade veio e evita perder o contexto no meio da programação.

Planilha da pré-programação

+1 linha +3 linhas +5 linhas

Qtd. livre

Adicionar

Grupo da obra

Observe o countdown da etapa, os cards de pendências e reservas, a previsão do tempo e a leitura rápida da planilha. A intenção aqui é montar um pacote inicial coerente para discussão com os empreiteiros.

Regras importantes da Pré-programação

- A etapa pode ser salva durante o preenchimento, sem necessidade de fechamento imediato.
- Se houver duplicidade de atividade para o mesmo empreiteiro, mesma descrição e mesmo Local 1, o sistema deve alertar o usuário.
- O fechamento da Pré-programação é pré-requisito para o fechamento da Reunião de PPC.

5.2 Reunião de PPC

Como chegar lá: Menu Lateral > Programação Semanal > Reunião de PPC.

- Registre data e hora da reunião.
- Use a etapa para gerar PDFs de convocação e atividades por empreiteiro.
- Depois da reunião, registre presença e preencha a ata.
- Somente empreiteiros ativos na semana devem compor lista de presença, convocação e ata.
- A reunião só pode ser fechada depois da Pré-programação fechada.

Reunião de PPC

PPC-Pro V1
Planejamento de curto prazo

Administrador PPC (ADMIN)

Reunião de PPC

Esta etapa organiza a reunião semanal do PPC em duas fases: preparação da reunião e registro final da presença/ata.

SEMANA: 14 **Atualizar**

DATA DE INÍCIO: 22/06/2026 DATA DE FIM: 27/06/2026

Prazo da lista de presença e ata: Sexta-feira, 19/06/2026 às 23:59 (hora local da obra) | Tempo restante: 4d 00h 21m 34s

Pré-programação
Ainda falta fechar a etapa anterior.

Data e hora
Reunião agendada para esta semana.

Empreiteiros ativos
6 empreiteiro(s) carregado(s) para a semana.

Fechamento
A reunião ainda está aberta para preenchimento.

1) Pré-reunião

Defina data e hora, gere os PDFs de apoio e prepare a convocação dos empreiteiros ativos da semana.

Data da Reunião de PPC
Auto-preenchimento com a semana anterior + 7 dias. 24/06/2026
Você pode ajustar manualmente.

Hora da Reunião de PPC
Formado 2h horas (HH:MM). 15:00

Salvar data/hora da reunião **Gerar PDF geral da pré-programação** **Gerar PDF ata + presença (pré-reunião)** **Enviar e-mail (atividades + convocação)**

EMPREITEIRO	TIPO DE MÃO DE OBRA	E-MAIL	AÇÕES
Civil	MO MANUTENÇÃO	civil@civil	PDF atividades PDF convocação
Fabio	MO MANUTENÇÃO	fabio@fabio	PDF atividades PDF convocação
Gerson	MO MANUTENÇÃO	gerson@gerson	PDF atividades PDF convocação
Julio	MO MANUTENÇÃO	julio@julio	PDF atividades PDF convocação
Pintura	MO MANUTENÇÃO	pintura@pintura	PDF atividades PDF convocação
Valdecir	MO MANUTENÇÃO	valdecir@valdecir	PDF atividades PDF convocação

2) Pós-reunião

Registro presença, ata e feche oficialmente a etapa da reunião semanal.

Você precisa fechar a pré-programação primeiro

EMPREITEIRO	TIPO DE MÃO DE OBRA	PRESENTE
Civil	MO MANUTENÇÃO	☐
Fabio	MO MANUTENÇÃO	☐
Gerson	MO MANUTENÇÃO	☐
Julio	MO MANUTENÇÃO	☐

A etapa da reunião funciona como ponte entre intenção e compromisso validado. É aqui que a obra formaliza quem participou, o que foi discutido e quais materiais serão distribuídos.

5.3 Programação da Semana

Como chegar lá: Menu Lateral > Programação Semanal > Programação da Semana.

- A Programação herda as atividades da Pré-programação e representa o compromisso final da semana.
- Depois da reunião, ajuste status, ordem, datas e distribuição final.
- Atividades pendentes vindas de semana anterior entram com status Pendente e não devem ter texto nem locais editáveis.
- Atividades Reserva herdadas continuam com status Reserva e podem ser alteradas para Planejada, caso a engenharia decida efetivar a execução.
- A Programação só pode ser fechada depois da Reunião de PPC fechada.

Programação da Semana

PPC-Pro V1
Planejamento de curto prazo

Administrador PPC (ADMIN)

Abertura e controle da semana

Programação da semana
Aqui entra a versão validada da semana. Use esta etapa para ajustar a programação após a reunião de PPC e fechar o pacote que vai gerar as atividades previstas, PDFs e controles da semana.

14 22/06/2026 27/06/2026 **Atualizar**

Prazo da programação: Sábado, 20/06/2026 às 23:59 (hora local da obra) | Tempo restante: 5d 00h 21m 29s

Status da semana: Aberta.

TOTAL DE LINHAS 0 Inclui linhas novas ainda não salvas.	PENDÊNCIAS 0 Viram de semanas anteriores e ficam travadas nos campos críticos.	RESERVAS 0 Podem continuar como reserva ou virar planejada na nova semana.	RETRABALHOS 0 Mostra quantas atividades já entraram com status de retrabalho.
--	---	---	--

Fechar planejamento

Previsão do tempo (domingo a sábado)

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026
Nublado	Chuva	Sol	Nublado	Nublado	Nublado	Sol
Min 7.9°C / Máx 19.0°C Prob. chuva: 40%	Min 10.2°C / Máx 14.5°C Prob. chuva: 54%	Min 7.9°C / Máx 14.5°C Prob. chuva: 21%	Min 5.9°C / Máx 12.1°C Prob. chuva: 23%	Min 8.2°C / Máx 15.2°C Prob. chuva: 24%	Min 5.3°C / Máx 11.9°C Prob. chuva: 22%	Min 4.4°C / Máx 14.8°C Prob. chuva: 18%
Chuva: 1.0 mm/h	Chuva: 21.2 mm/h	Chuva: 0.0 mm/h	Chuva: 3.6 mm/h	Chuva: 4.8 mm/h	Chuva: 0.0 mm/h	Chuva: 0.0 mm/h

Leitura rápida da planilha

Como ler a planilha desta etapa

- Pendente:** veio de semana anterior, mantém tarefa e locais travados para preservar o histórico.
- Reserva:** volta para a semana seguinte como reserva, mas o status pode ser ajustado para *Planejada* quando fizer sentido.
- Rascunho:** linha azul criada localmente e ainda não salva.
- Semana de origem:** ajuda a entender de onde cada atividade veio e evita perder o contexto no meio da programação.

Planilha da semana

+ 1 linha + 3 linhas + 5 linhas

Qtd. livre

Adicionar

Grupo da obra

Esta é a referência oficial da semana. Tudo o que aparece em Atividades Previstas, PDFs operacionais e base de comparação do feedback nasce do fechamento desta etapa.

5.4 Atividades Previstas

Como chegar lá: Menu Lateral > Programação Semanal > Atividades Previstas.

- Mostra somente as atividades validadas pela Programação fechada.
- É a base operacional mais limpa para distribuição por empreiteiro, exportações e PDFs definitivos.
- Quando a Programação ainda não está fechada, esta etapa não deve ser tratada como versão oficial da semana.

5.5 Feedback da Semana

Como chegar lá: Menu Lateral > Feedback > Feedback da Semana.

- O Feedback registra o que realmente aconteceu: executada, iniciada, não iniciada, cancelada ou executada não planejada.
- O salvamento pode ser parcial. O fechamento, não: ele exige consistência completa.
- Atividades iniciadas e não iniciadas exigem grupo da causa, causa e comentário, salvo quando forem Reserva não concluída.

- Canceladas não exigem causa obrigatória, mas podem receber comentário.
- Ao fechar o feedback, o sistema alimenta pendências, histórico de causas e comparações com semanas futuras.

Feedback da Semana

PPC-Pro V1
Planejamento de curto prazo

Administrador PPC (ADMIN)

Feedback da semana
Use esta etapa para registrar o que foi executado, o que ficou pendente e quais causas explicam o não cumprimento do plano.

SEMANA: 13 **Atualizar**

DATA DE INÍCIO: 15/06/2026 DATA DE FIM: 20/06/2026 **Salvar feedback da semana** **Gerar PDF comparativo da Semana 13**

Resumo do Feedback

Feedback em andamento	EXECUTADAS	INICIADAS	NÃO INICIADAS	CANCELADAS	EXEC. NÃO PLANEJADAS
0	0	0	0	0	0

Prazo do feedback: Sexta-feira, 19/06/2026 às 12:00 (hora local da obra) | Tempo restante: 3d 12h 22m 24s

Regras rápidas do feedback

- Executada, Executada / Não planejada e Cancelada não abrem causa.
- Iniciada e Não iniciada exigem grupo da causa, causa e comentário.
- Reserva não concluída fica com fundo cinza e continua sem causa obrigatória.
- Salvar pode ser parcial; a validação completa acontece apenas no fechamento do feedback.

Fechar feedback da semana

Itens para feedback

#	EMPREENHEIRO	LOCAL 1	LOCAL 2	TAREFA	STATUS DO FEEDBACK	GRUPO DA CAUSA	CAUSA	COMENTÁRIO	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	AÇÕES
Filtrar	Filtrar	Filtrar	Filtrar	Todos	Filtrar	Filtrar	Filtrar								Ver

Sem tarefas para feedback nesta semana.

☐ Fundo cinza = atividades Reserva

Registrar atividade executada não planejada
Use este bloco somente para atividades que não estavam previstas na programação da semana e que ainda assim foram executadas.

Local 1: [Selecione] Local 2 (opcional): [Selecione] Empregueiro: [Selecione]

Encarregado: [Selecione] Nova atividade não planejada (tarefa): [Selecione] Data real início (DD/MM/AAAA): [Selecione]

Data real fim (DD/MM/AAAA): [Selecione] Dias executados (ou use datas): [Selecione]

Adicionar atividade executada não planejada

Acesso à obra autorizado.

Repare nos cards-resumo, no countdown, na legenda das regras e na tabela com filtros. O feedback é a etapa que mais exige disciplina, porque é dela que saem pendências, aprendizado e indicadores de desempenho.

Regras críticas do Feedback

- Executada, Executada / Não planejada e Cancelada não abrem causa obrigatória.
- Iniciada e Não iniciada exigem grupo da causa, causa e comentário.
- Reserva não concluída fica sem causa obrigatória e deve ser identificada visualmente para não induzir preenchimento incorreto.
- Somente depois do fechamento do Feedback a semana pode avançar para Qualidade Percebida.

5.6 Qualidade Percebida

Como chegar lá: Menu Lateral > Feedback > Qualidade Percebida.

- A Qualidade Percebida avalia cada empregado ativo da semana em PPC, colaboração, qualidade, segurança e limpeza.



- A etapa só é liberada depois do fechamento do Feedback.
- Ela só pode ser fechada quando todos os empreiteiros da semana estiverem avaliados.
- Depois de fechada, o sistema precisa indicar a situação fechada, esconder o botão de fechamento e liberar a reabertura apenas para administrador.

Qualidade Percebida

PPC-PRO V1

Administrador PPC (ADMIN)

Qualidade percebida

A Qualidade Percebida só pode ser fechada após o fechamento do Feedback da Semana e com 100% dos empreiteiros avaliados.

SEMANA

13

Atualizar

DATA DE INÍCIO

15/06/2026

DATA DE FIM

20/06/2026

Salvar qualidade percebida

Prazo da qualidade percebida: Sexta-feira, 19/06/2026 às 12:00 (hora local da obra) | Tempo restante: 3d 12h 22m 19s

AVALIAÇÃO

Sem dados

Selecione uma semana com empreiteiros ativos.

Fechar qualidade percebida da semana

Faixas de avaliação da obra

Prazo (PPC)

Regular a partir de 60% | Bom a partir de 80%

Qualidade

Regular a partir de 5 | Bom a partir de 8

Colaboração

Combina presença do encarregado na reunião de PPC com a nota da equipe. Impacto da presença: 3 | Regular a partir de 5 | Bom a partir de 8

Segurança

Regular a partir de 5 | Bom a partir de 8

Limpeza

Regular a partir de 5 | Bom a partir de 8

Itens de Qualidade Percebida

#	EMPREITEIRO	QUALIDADE (0-10)	COLABORAÇÃO EQUIPE (0-10)	SEGURANÇA (0-10)	LIMPEZA (0-10)	COMENTÁRIOS
Sem empreiteiros ativos para avaliação nesta semana.						

Acesso à obra cassado.

A avaliação usa notas e carinhas para traduzir rapidamente a percepção sobre cada empreiteiro. Essa camada complementa o PPC, porque olha não só prazo, mas também colaboração, limpeza, qualidade e segurança.

6. RELATÓRIOS, PDFs E DASHBOARDS

6.1 PDFs operacionais


- O sistema gera PDFs de atividades por empreiteiro, listas gerais, atas, convocações, comparativos, calendários de feriados e documentos de apoio.
- Cada documento tem finalidade própria: comunicação com empreiteiro, reunião de PPC, auditoria de fechamento ou leitura gerencial.
- O padrão visual e o cabeçalho institucional reforçam rastreabilidade e profissionalismo.

6.2 Relatório da Semana

Como chegar lá: Menu Lateral > Gestão e Dashboards > Relatório da Semana.

- O relatório semanal é o dossiê da semana fechada.
- Ele combina desempenho PPC, causas, ranking de empreiteiros, qualidade percebida e governança.
- É o documento ideal para reunião de engenharia, cobrança da diretoria e registro formal do que ocorreu na semana.

Tela do Relatório da Semana

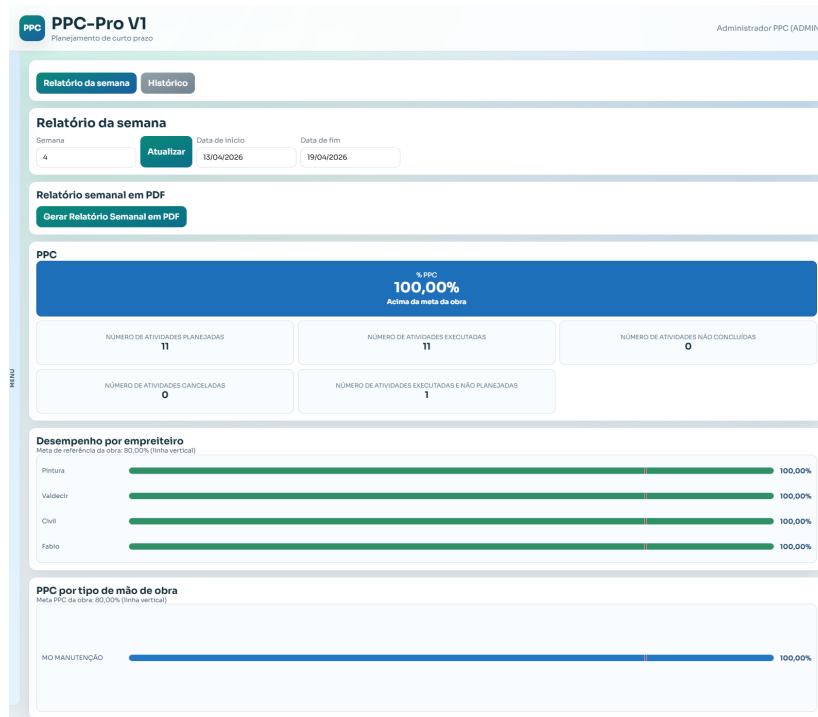

A interface apresenta filtros e indicadores antes da geração do PDF. O PDF final aprofunda a leitura com capítulos, seções e material pronto para apresentação.



6.3 Histórico da obra

- O histórico mostra a trajetória acumulada da obra ao longo do tempo.
- É nele que a gestão enxerga tendência de desempenho, evolução mensal, recorrência de causas, desempenho por empreiteiro e qualidade do planejamento.
- O valor do histórico depende da disciplina semanal. Se o fluxo operacional for mal preenchido, a leitura histórica perde confiabilidade.



7. REGRAS DE NEGÓCIO FUNDAMENTAIS

7.1 Ordem das etapas e travas

- A ordem lógica do processo é: Pré-programação, Reunião de PPC, Programação, Atividades Previstas, Feedback e Qualidade Percebida.
- A Reunião não deve ser fechada sem Pré-programação fechada.
- A Programação não deve ser fechada sem Reunião fechada.
- O Feedback não deve ser tratado como encerrado antes da Programação fechada.
- A Qualidade Percebida não deve ser fechada antes do Feedback e antes da avaliação de todos os empreiteiros ativos.

7.2 Pendências, reservas, retrabalho e semana de origem

- Atividade planejada não concluída volta na semana seguinte como Pendente, com semana de origem preservada.
- Atividade Reserva não concluída volta como Reserva, e seu status pode ser ajustado na nova semana.
- Atividade de retrabalho deve ser identificada para que o histórico e os indicadores reflitam essa condição.
- A coluna de semana de origem preserva a memória de onde cada atividade nasceu, mesmo quando ela se arrasta por mais de uma semana.

7.3 Causas, cancelamentos e desempenho

- Causas bem preenchidas explicam por que o plano não foi cumprido.
- Causas marcadas como específicas do empreiteiro afetam indicadores que medem performance da empresa executora.
- Cancelamentos alteram a leitura da qualidade do planejamento e do desempenho da semana.
- Atividades executadas e não planejadas afetam a qualidade da programação, mas não contam como atividade planejada executada no PPC clássico.

7.4 Fechamento, reabertura e auditoria

- Fechar uma etapa deve registrar data, hora e responsável.
- Reaberturas são exceções gerenciais e precisam ficar rastreadas.
- Salvar não é o mesmo que fechar: salvar preserva rascunho; fechar consolida a etapa para as análises seguintes.
- Essa diferença é essencial para evitar perda de trabalho e para manter o histórico auditável.



8. CHECKLIST DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

8.1 Antes de começar a usar em uma obra nova

- Cadastre a construtora.
- Cadastre a obra com data de início correta e meta PPC definida.
- Cadastre ou revise empreiteiros, tipos de mão de obra, grupos de atividades e causas de não cumprimento.
- Monte zoneamento, feriados, prazos e parâmetros de qualidade percebida.
- Vincule usuários e perfis antes de colocar a equipe para operar.

8.2 Rotina semanal recomendada

- Início do ciclo: montar a Pré-programação da semana futura.
- Depois: convocar empreiteiros, realizar a Reunião de PPC e fechar presença/ata.
- Na sequência: consolidar e fechar a Programação da Semana.
- Durante ou após a execução: preencher e salvar o Feedback, mesmo em mais de um momento, até concluir todas as informações.
- Por fim: avaliar todos os empreiteiros ativos na Qualidade Percebida e gerar os relatórios da semana.

8.3 Erros mais comuns e como evitar

Pular etapas

Isso gera erro, confusão de contexto e perda de força do histórico. Sempre avance na ordem natural do processo.

Fechar cedo demais

Fechar uma etapa sem revisar pendências, reservas, causas e datas produz relatórios menos confiáveis e aumenta a necessidade de reabertura.

Usar o sistema só como planilha

O diferencial do PPC-Pro está em transformar preenchimento em método, histórico e análise. Quem usa só a planilha perde o principal valor do produto.
